

社会資本総合整備計画

加茂市街地地区第二期都市再生整備計画(第2回変更)

令和4年12月

新潟県加茂市

社会資本総合整備計画

令和 4年 12月

計画の名称										加茂市街地地区第二期都市再生整備計画										重点配分対象の該当																													
計画の期間										令和1年度 ~ 令和6年度 (6年間)										交付対象		加茂市																											
計画の目標										北越の小京都の風情を持った魅力あるまちづくりを目指す。 目標1：小京都らしい風情の創出、目標2：山-市街地-役所周辺を結ぶ回遊性の創出、目標3：イベント等の受け入れの収容量の確保、目標4：災害に強いまちづくり																																							
計画の成果目標（定量的指標）										<ul style="list-style-type: none"> ・新町木造雁木 歩行者数 歩行者数を348人/日(H30)から450人/日(R6)に増加 ・新町多目的広場イベント参加者数 参加者数を0人/日(H30)から250人/日(R6)に増加 ・計画区域内の避難困難者数 避難困難者数を390人(H30)から0人(R6)に減少 ・健康ウォーク参加者数 参加者数を302人/回(R2)から500人/回(R6)に増加 																																							
定量的指標の定義及び算定式										<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (H30当初)</th> <th>中間目標値</th> <th>最終目標値 (R6末)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新町木造雁木における平日12時間の断面歩行者数を測定する</td> <td>348人/日</td> <td></td> <td>450人/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>新町多目的広場において開催するイベントの参加者数を測定する</td> <td>0人/回</td> <td></td> <td>250人/回</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計画区域内において半径250m以内に一時避難場所を持たない区域に居住する人を減少させる</td> <td>390人</td> <td></td> <td>0人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>駅前商店街や若宮公園、下条ダムをコースとしたウォークイベントにおける参加者数を測定する</td> <td>302人/回</td> <td></td> <td>500人/回</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値 (H30当初)	中間目標値	最終目標値 (R6末)	新町木造雁木における平日12時間の断面歩行者数を測定する	348人/日		450人/日		新町多目的広場において開催するイベントの参加者数を測定する	0人/回		250人/回		計画区域内において半径250m以内に一時避難場所を持たない区域に居住する人を減少させる	390人		0人		駅前商店街や若宮公園、下条ダムをコースとしたウォークイベントにおける参加者数を測定する	302人/回		500人/回			
	定量的指標の現況値及び目標値			備考																																													
	当初現況値 (H30当初)	中間目標値	最終目標値 (R6末)																																														
新町木造雁木における平日12時間の断面歩行者数を測定する	348人/日		450人/日																																														
新町多目的広場において開催するイベントの参加者数を測定する	0人/回		250人/回																																														
計画区域内において半径250m以内に一時避難場所を持たない区域に居住する人を減少させる	390人		0人																																														
駅前商店街や若宮公園、下条ダムをコースとしたウォークイベントにおける参加者数を測定する	302人/回		500人/回																																														
全体事業費		合計 (A+B+C)		733百万円		A		733百万円		B		-		C		-		D		-		効果促進事業費の割合		0.0%																									
交付対象事業																																																	
A1 基幹事業																																																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)						全体事業費 (百万円)	費用便益 比 B/C	備考																																
A-1	都市再生	一般	加茂市	直接	加茂市	加茂市街地第二地区都市再生整備計画事業	公園、地域生活基盤施設、高質空間形成施設等	加茂市	R1	R2	R3	R4	R5	R6	733.0	-																																	
合計															733.0																																		
B 関連社会資本整備事業																																																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)						全体事業費 (百万円)	備考																																	
									R1	R2	R3	R4	R5	R6																																			
合計																																																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考																																	
C 効果促進事業																																																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)						全体事業費 (百万円)	備考																																	
									R1	R2	R3	R4	R5	R6																																			
合計															0																																		
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考																																	

D 社会資本整備円滑化地積整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業個所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)						金体事業費 (百万円)	備考	
									R1	R2	R3	R4	R5	R6			
													合計	0			
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考	


交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R1	R2	R3	R4	R5	R6
配分額 (a)	32.4	42.4	38.4	12.9		
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	32.4	42.4	38.4	12.9		
前年度からの繰越額 (d)	0	17.1	35.4	24.1		
支払済額 (見込みを含む) (e)	15.3	24.1	49.7			
翌年度繰越額 (f)	17.1	35.4	24.1			
うち未契約 繰越額 (g)	0	18	10.3			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0			
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.0%	30.3%	14.0%			
未契約繰越＋不用率 が10%を超えている 場合その理由		補正による繰 越のため	事業計画の見 直しによる繰 越のため			

(参考図面)

計画の名称	加茂市街地地区第二期都市再生整備計画	交付対象	加茂市
計画の期間	令和1年度 ~ 令和6年度 (6年間)		

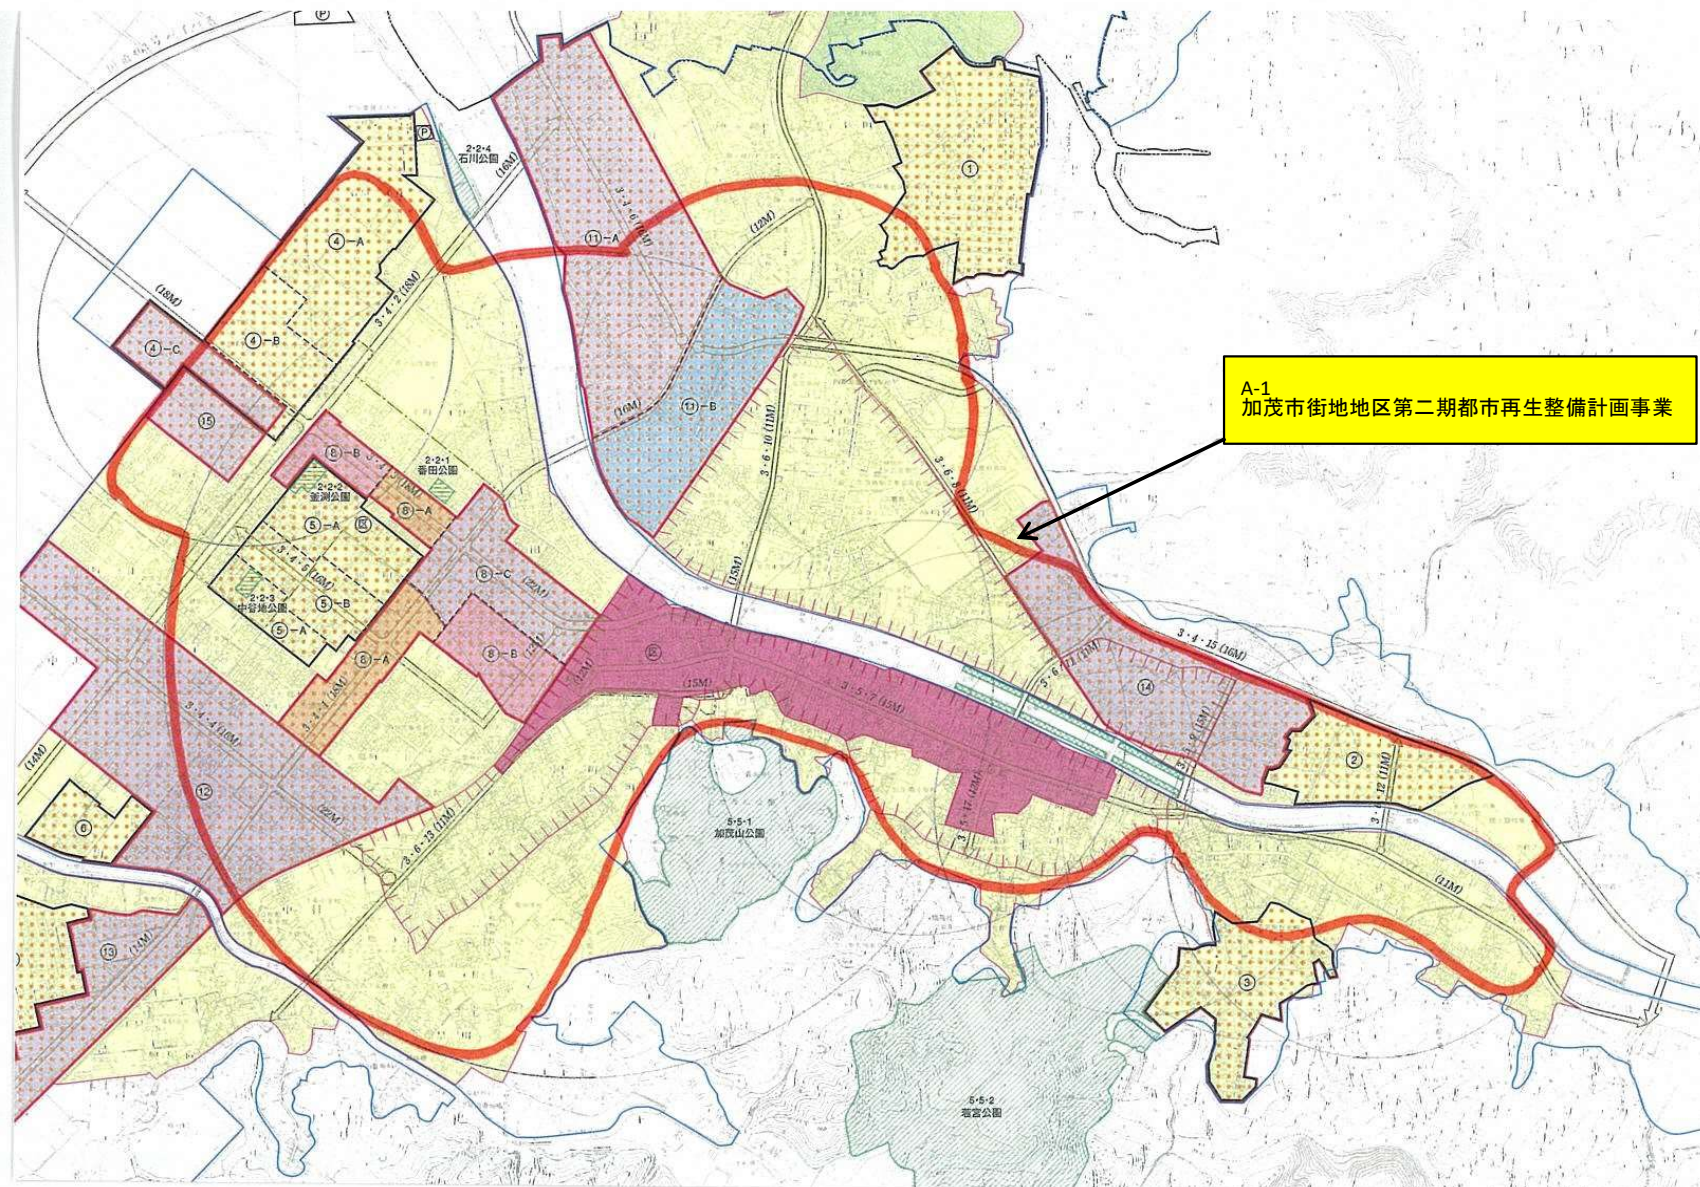

A-1
加茂市街地地区第二期都市再生整備計画事業
